



COMUNE DI LIVORNO



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Coordinamento e Monitoraggio Programmazioni Settoriali e PNRR
Settore Coordinamento attuativo PNRR

Dicembre 2023

2


SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Gli interventi della Città.....	5
3. Stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre 2023	11
4. Andamento finanziario degli interventi PNRR.....	32
5. I risultati attesi: l'impatto dell'operazione e il valore pubblico	34
6. Interventi PNRR messi a terra nel Comune di Livorno e nel territorio provinciale e limitrofo tramite le società e d enti del G.A.P.	39
7. Conclusioni e aggiornamento normativo (marzo 2024).....	44
Tabella 1 - Suddivisione per Missioni	5
Tabella 2 - Suddivisione per Ministero titolare	6
Tabella 3- Suddivisione per settore dell'Ente	7
Tabella 4 - Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni.....	7
Tabella 5 - Andamento di cassa - annualità 2021/2023.....	33
Grafico – Allocazione dei fondi nei bilanci 2022-2026.....	10
Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti	30

1. PREMESSA

In seguito alla D. GC. n. 424 del 20/06/2023, con la quale è stata prevista l'istituzione di una nuova posizione dirigenziale ex art. 110, c. 1 del TUEL per il coordinamento attuativo del PNRR, ai sensi dell'art. 8, c.1, del D.L. 13/2023, convertito in L. 43/2023, con il conseguente avvio di procedura selettiva pubblica, con Ordinanza del Sindaco n. 485 del 28/12/2023 è stato conferito l'incarico dirigenziale di direzione del Settore "Coordinamento attuativo del PNRR - art. 8 D.L. 13/2023 convertito con L. 43/2023".

Lo schema di approccio all'organizzazione del PNRR in seguito a tale ultima modifica è rappresentato come segue:

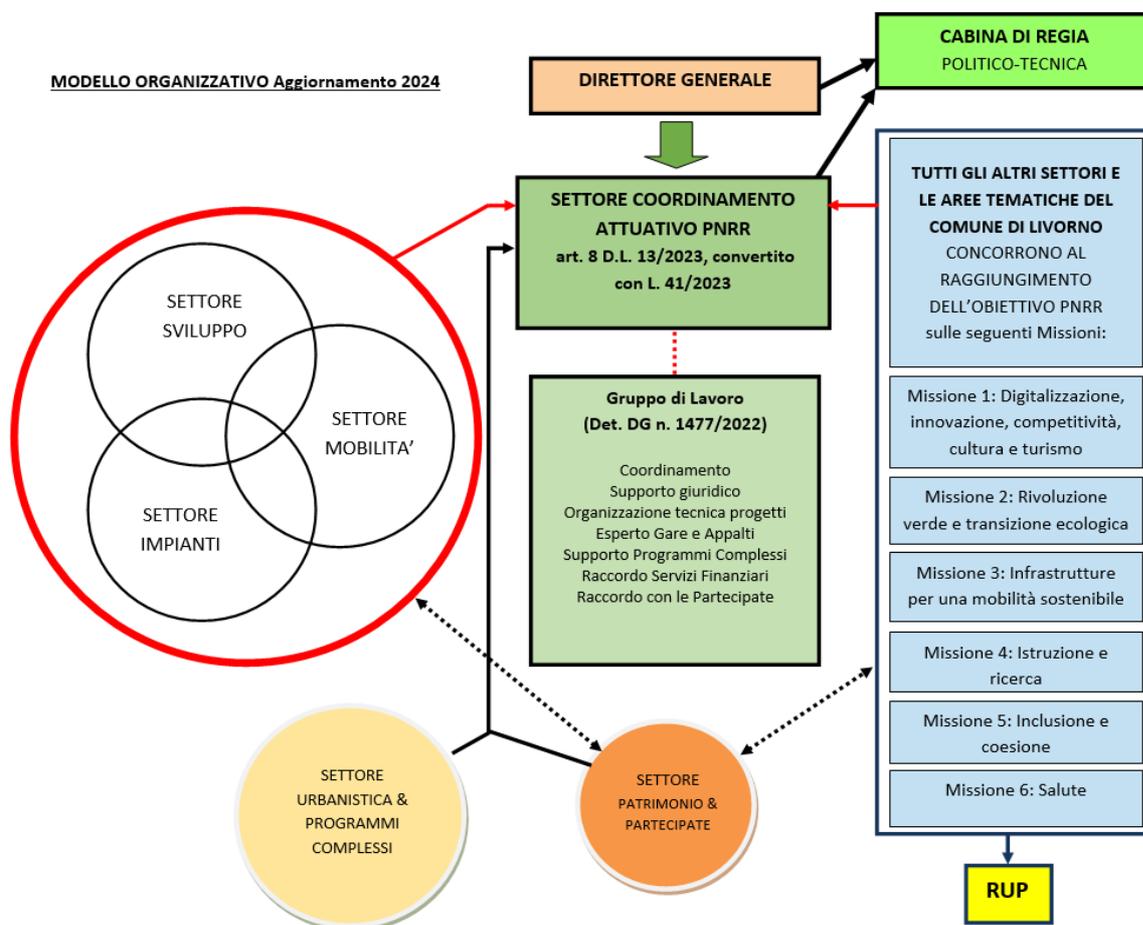

In questa relazione sono stati presi in considerazione gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Livorno in qualità di soggetto attuatore e quindi direttamente beneficiario dei finanziamenti PNRR, aggiornandoli al 31 dicembre 2023.

I dati analizzati sono stati rilevati dal programma di contabilità dell'ente e dal sistema informativo "ReGIS" che rappresenta la piattaforma unica attraverso la quale le Amministrazioni possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal PNRR.

Si intende pertanto illustrare il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza per la città di Livorno e la sua attuazione, evidenziando i progressi compiuti nel suo complessivo avanzamento alla data del 31 dicembre 2023, aggiornando anche la situazione finanziaria degli interventi PNRR, con riferimento alle risorse incassate in seguito all'erogazione da parte delle Amministrazioni titolari a titolo di anticipo e ai relativi pagamenti effettuati dall'ente.

Si ricorda infine che vi sono anche n. 15 interventi candidati dalle società e dagli enti appartenenti al Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) che impattano sul territorio Comunale e provinciale, di cui è stata fatta specifica illustrazione nel precedente numero di questa rivista e dei quali pubblichiamo qui un aggiornamento alla data del 31/12/2023. Il valore complessivo di tali opere ammonta ad € 49.828.335,30.

Il valore complessivo degli interventi nel territorio livornese, considerando sia quelli di cui il Comune è soggetto attuatore, che quelli del G.A.P., ammonta ad € 133.643.857,07.

2. GLI INTERVENTI DELLA CITTÀ

La città di Livorno è attualmente soggetto attuatore, con n. 46 progetti candidati, di n. 45 interventi finanziati e n. 1 in corso di finanziamento. Tali progetti sono suddivisi tra 4 Missioni, per un ammontare complessivo di risorse pari a **83.815.521,77 euro** (esclusi 210.000,00 euro in attesa di finanziamento).

Di questi:


€ 68.042.932,37 sono trasferimenti ministeriali PNRR (esclusi 210.000,00 euro in attesa di finanziamento)

€ 15.772.589,40 costituiscono invece il cofinanziamento dell'ente.

Nella *Tabella 1* si riporta l'ammontare complessivo delle opere, comprensivo sia dei finanziamenti ministeriali, sia delle risorse proprie dell'ente, così come sono stati suddivisi su 4 missioni del PNRR. Come possiamo vedere, più della metà delle risorse, pari al 58,60% è allocato sulla Missione M5 "Inclusione e coesione", seguita dal 27,62% sulla Missione M4 "Istruzione e ricerca".

Tabella 1 - Suddivisione per Missioni


Missione	Valore complessivo	Percentuale
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	2.645.256,20	3,16
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	8.906.125,70	10,63
M4 - Istruzione e ricerca	23.149.999,96	27,62
M5 - Inclusione e coesione	49.114.139,91	58,60
Totale	83.815.521,77	100,00

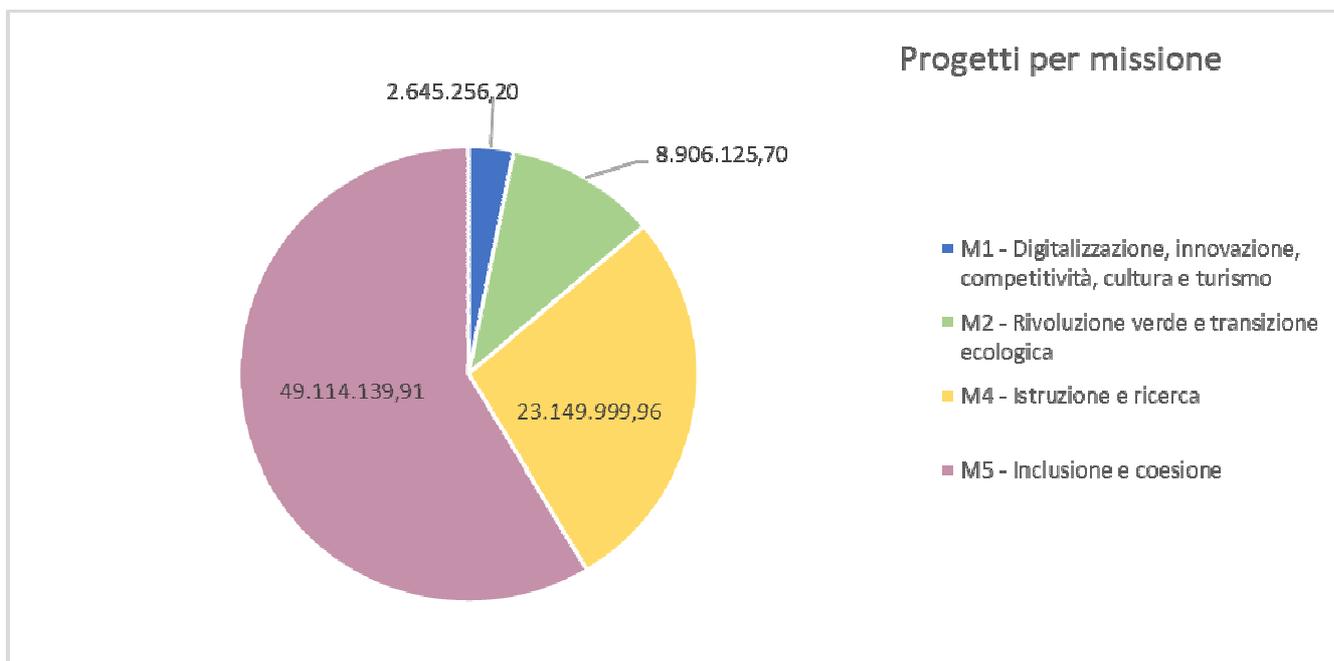

Nella *Tabella 2* si riporta l'ammontare dei finanziamenti ministeriali PNRR, suddiviso sulla base delle Amministrazioni titolari degli interventi. Possiamo vedere che il Comune di Livorno ha un maggior trasferimento di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 48,05%, seguito dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il 20,87% e dal Ministero dell'Interno per il 12,65%.


Tabella 2 - Suddivisione per Ministero titolare

Ministero	Valore complessivo	Percentuale
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	2.017.909,00	3,00
Cultura	500.000,00	0,74
Interno	8.506.125,70	12,65
Istruzione e del merito	14.034.757,76	20,87
Infrastrutture e Trasporti	32.692.663,11	48,05
PCM - Dipartimento Sport	3.850.000,00	5,66
Lavoro e Politiche sociali	6.441.476,80	9,47
Totale	68.042.932,37	100,00

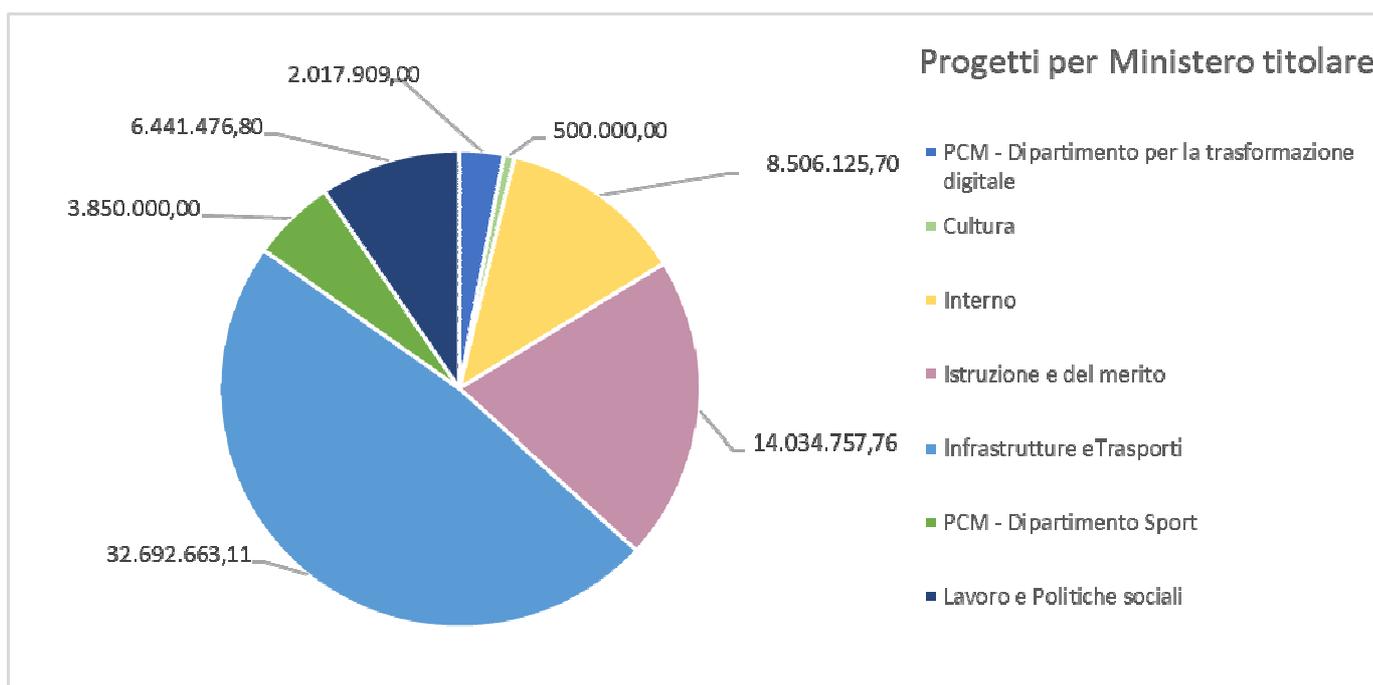

Nella *Tabella 3* si riporta l'ammontare del valore complessivo delle opere PNRR suddiviso sulla base dei settori dell'Ente titolari degli interventi.

Tabella 3 - Suddivisione per settore dell'Ente

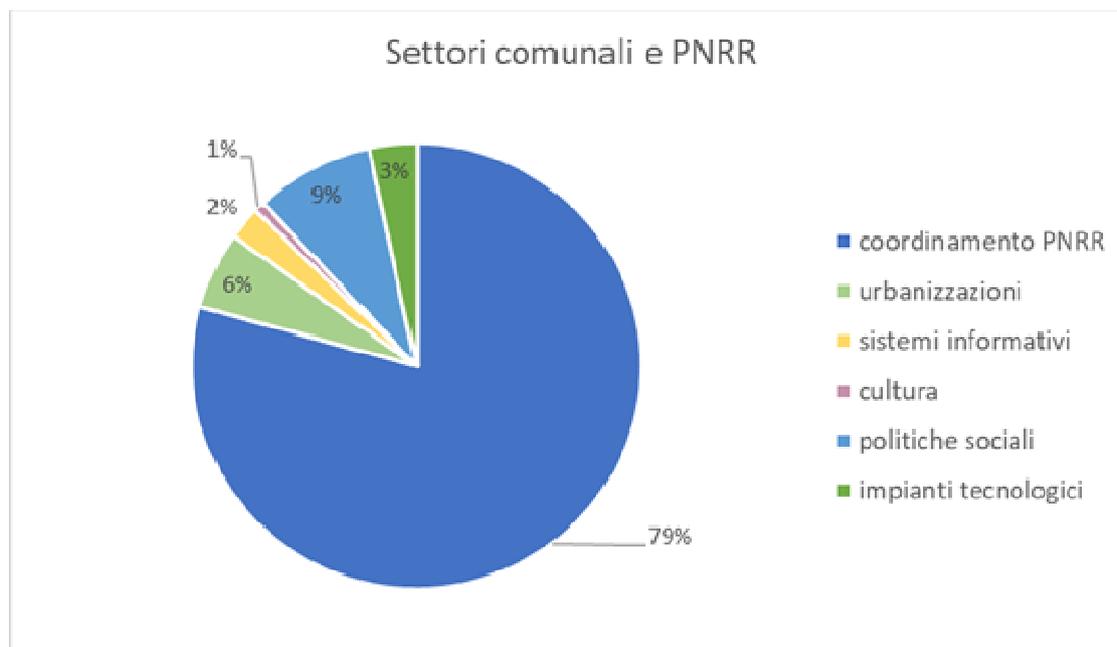

Nella *Tabella 4* si evidenziano gli interventi sui quali il Comune di Livorno sta impegnando le risorse del PNRR.

Tabella 4 – Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M1C1 I1.2	Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni	1.031.574,00	-	1.031.574,00	1,23
M1C1 I1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni	203.435,00	-	203.435,00	0,24
M1C1 I1.4.1	Servizi e cittadinanza digitale	516.323,00	-	516.323,00	0,62
M1C1 I1.4.3	Adozione piattaforma PAGOPA	112.627,00	-	112.627,00	0,13
M1C1 I1.4.3	Adozione "App IO" Comuni	54.950,00	-	54.950,00	0,07
M1C1 I1.4.5	Piattaforma notifiche digitali Comuni	69.000,00	-	69.000,00	0,08
M1C1 I1.7.2	Centri di facilitazione digitale	30.000,00	-	30.000,00	0,04
	Totale	2.017.909,00	-	2.017.909,00	2,41

CULTURA E TURISMO					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M1C3 I1.2	Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori	500.000,00	127.347,20	627.347,20	0,75

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M2C4 I2.2/B	Palazzetto dello sport "Palamacchia" - manutenzione straordinaria	210.000,00	40.000,00	250.000,00	0,30
M2C4 I2.2	Stadio comunale - risanamento conservativo	210.000,00	290.000,00	500.000,00	0,60
M2C4 I2.2	Scuola Micheli - restauro facciate	600.000,00		600.000,00	0,72
M2C4 I2.2	Scuola primaria e infanzia Tartaruga/Puccini – Adeguamento impianto antincendio	160.391,36	-	160.391,36	0,19
M2C4 I2.2	Centro infanzia la Giostra – Adeguamento impianto antincendio	159.729,29	-	159.729,29	0,19
M2C4 I2.2	Scuola primaria De Amicis – Adeguamento impianto antincendio	215.175,45	-	215.175,45	0,26
M2C4 I2.2	Scuola primaria Benci – Adeguamento impianto antincendio	453.198,23	-	453.198,23	0,54
M2C4 I2.2	Scuola primaria Carducci – Adeguamento impianto antincendio	566.858,52	-	566.858,52	0,68
M2C4 I2.2	Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta – Adeguamento impianto antincendio	230.000,00	-	230.000,00	0,27
M2C4 I2.2	Scuola primaria e infanzia D'Azeglio/Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio	100.000,00	-	100.000,00	0,12
M2C4 I2.2	Scuola d'infanzia Bimbi Allegrì - riqualificazione energetica	331.647,15	-	331.647,15	0,40
M2C4 I2.2/A	Centrale termica palazzine RR.SS.AA. - efficientamento energetico	89.125,70	-	89.125,70	0,11
M2C4 I2.2/A	Nido Alveare - Adeguamento impianto antincendio	165.000,00	-	165.000,00	0,20
M2C4 I2.2/A	Materna Alveare - Adeguamento impianto antincendio	175.000,00	-	175.000,00	0,21
M2C4 I2.2	Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti pubblica illuminazione	210.000,00	-	210.000,00	0,25
M2C4 I2.2	Sistemazione area fluviale ASIP - zona Magrignano	1.700.000,00	-	1.700.000,00	2,03
M2C4 I2.2	Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci	730.000,00	2.270.000,00	3.000.000,00	3,58
	Totale	6.306.125,70	2.600.000,00	8.906.125,70	10,63
IN ATTESA DI FINANZIAMENTO					
M2C4 I2.2	Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti pubblica illuminazione 2024	210.000,00	-	210.000,00	0,25

ISTRUZIONE E RICERCA					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M4C1 I1.1	Rifunzionalizzazione Scuola infanzia Via Poerio come Centro polifunzionale per la famiglia	2.170.000,00	-	2.170.000,00	2,59
M4C1 I1.1	Asilo nido Pirandello, Via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture	1.896.000,00	844.000,00	2.740.000,00	3,27
M4C1 I3.3	Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino	5.280.000,00	-	5.280.000,00	6,30
M4C1 I3.3	Nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero	2.520.000,00	-	2.520.000,00	3,01
M4C1 I3.3	Nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel – nuova scuola primaria e secondaria di 1° grado	2.168.757,76	8.271.242,20	10.439.999,96	12,46
	Totale	14.034.757,76	9.115.242,20	23.149.999,96	27,62

INCLUSIONE E COESIONE					
Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA)					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M5C2 I2.3	Cisternone - riqualificazione quartiere Stazione	13.195.999,87	-	13.195.999,87	15,74
M5C2 I2.3	Cisternone - riqualificazione parco Pertini	2.639.722,46	-	2.639.722,46	3,15
M5C2 I2.3	Cisternone - parcheggio Del Corona	1.323.654,46	-	1.323.654,46	1,58
M5C2 I2.3	Dogana d'Acqua - Caserma Lamarmora, recupero e rifunzionalizzazione	10.276.702,63	2.000.000,00	12.276.702,63	14,65
M5C2 I2.3	Dogana d'Acqua - edificio polifunzionale CRAL e giochi d'acqua	5.256.583,69	400.000,00	5.656.583,69	6,75
	Totale	32.692.663,11	2.400.000,00	35.092.663,11	41,87
Progetti di rigenerazione urbana					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M5C2 I2.1	Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2,62
Sport e inclusione sociale					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M5C2 I3.1	Nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia	3.850.000,00	800.000,00	4.650.000,00	5,55
Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore					
Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
M5C2 I1.1.1	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPIPI)	211.500,00	-	211.500,00	0,25
M5C2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00	-	715.000,00	0,85
M5C2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità A.U.S.L.	715.000,00	-	715.000,00	0,85
M5C2 I1.1.2	Interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti	2.460.000,00	-	2.460.000,00	2,94
M5C2 I1.1.3	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione A.U.S.L.	330.000,00	-	330.000,00	0,39
M5C2 I1.1.4	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	209.976,80	-	209.976,80	0,25
M5C2 I1.3.1	Povertà estrema - Housing first	710.000,00	587.443,00	1.297.443,00	1,55
M5C2 I1.3.2	Povertà estrema – Stazioni di posta	1.090.000,00	142.557,00	1.232.557,00	1,47
	Totale	6.441.476,80	730.000,00	7.171.476,80	8,56

Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
68.042.932,37	15.772.589,40	83.815.521,77	100,00


Come possiamo vedere la maggiore parte delle risorse PNRR è concentrata sul Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA), che incide per il 41,87% sull'importo totale delle risorse PNRR.

Il 27,62% delle risorse PNRR è invece utilizzato per il potenziamento dell'Offerta dei Servizi di Istruzione.

Seguono poi gli interventi di riqualificazione energetica, per il 10,63%, quelli relativi all'inclusione Sociale per l'8,56%, quelli relativi allo Sport per il 5,55%, quelli relativi alla rigenerazione urbana per il 2,62%, quelli relativi alla Digitalizzazione per il 2,41% e quelli relativi alla Cultura e Turismo per lo 0,75%.


Infine, il seguente grafico mostra come sono stati allocati i fondi del PNRR nei bilanci dell'ente 2022-2026. L'allocazione di una quota maggiore di risorse risulta essere negli esercizi 2024 e 2025, in quanto anni decisivi per la messa a terra delle risorse ministeriali.

Grafico – Allocazione dei fondi nei bilanci 2022-2026

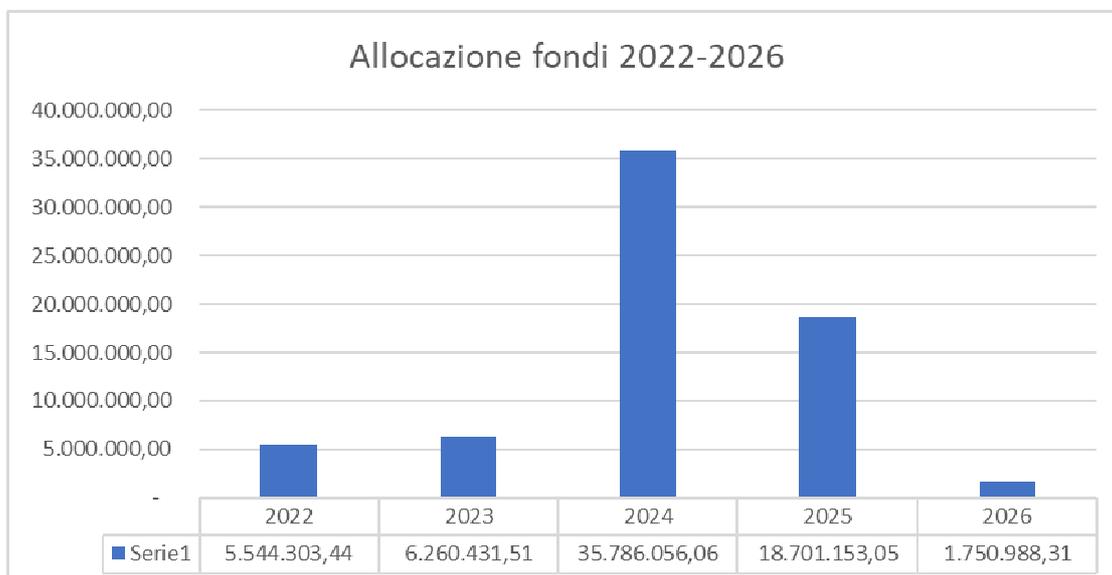

Localizzazione interventi PNRR

Sul sito istituzionale della città di Livorno, all'interno della sezione PNRR-Next Generation, è possibile localizzare i vari interventi PNRR sul territorio della città sulla mappa pubblicata. Di seguito l'immagine della mappa relativa agli interventi PNRR sul territorio della città di Livorno
(Indirizzo web: <https://www.comune.livorno.it/pnrr-next-generation-livorno>)

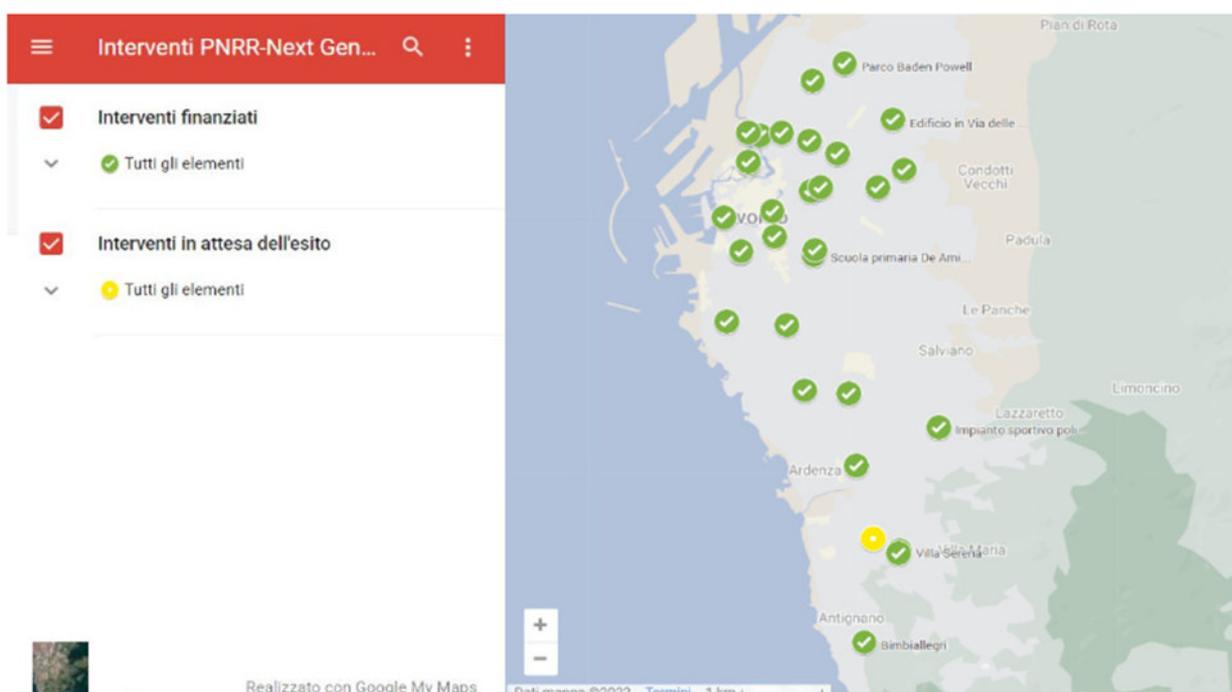

3. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2023

M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
C1 – Digitalizzazione, innovazione, e sicurezza nella PA
Settore Sistemi Informativi

Come si può vedere dalle tabelle di seguito riportate, due dei progetti PNRR relativi alla digitalizzazione sono stati asseverati (“Piattaforma notifiche digitali Comuni” e “Adozione piattaforma PAGOPA”), cioè è stato accertato dagli enti preposti dal Governo che gli interventi di digitalizzazione in questione sono stati effettivamente realizzati nei modi e nei tempi prescritti dai bandi. Il nostro Comune è quindi in attesa dell'erogazione del relativo finanziamento.

M1C1I1.4.3 Adozione "App IO" Comuni

CUP J41F22001020001

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 54.950,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio: Determina n. 253 del 16/01/2023

Ditta: Partners Associates advanced business solutions - P.A. ABS

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M1C1I1.4.3 Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni

CUP J41C22000930006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.031.574,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio: Determina n. 5900 del 03/08/2023

Ditta: Municipia Spa

Esecuzione lavori: entro 18 mesi dalla contrattualizzazione del fornitore

Stato di attuazione: aggiudicato

In fase di esecuzione nei primi mesi del 2024

M1C1I1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale

CUP J41F22004150006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 516.323,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio: Determina n. 9820 del 14/12/2023

Ditta: Ditta Maggioli

Stato di attuazione: aggiudicato

In fase di esecuzione nei primi mesi del 2024

M1C1I1.4.5 Piattaforma notifiche digitali Comuni

CUP J41F22004350006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 69.000,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio: Determina n. 1801 del 17/03/2023

Ditta: Maggioli Spa

Stato di attuazione: Asseverato, in attesa di riscossione

M1C1I1.4.3 Adozione piattaforma PAGOPA

CUP J41F22002200006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 112.627,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Stato di attuazione: Asseverato in data 16/12/2023, in attesa di riscossione

M1C1I1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni

CUP J51F22009470006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 203.435,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Stato di attuazione: predisposizione atti propedeutici alla procedura di appalto

M1C1I1.7.2 Centri di facilitazione digitale

CUP J49I23000730006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 30.000,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento realizzazione attività mediante coprogettazione: Determina n. 7857 del 17/10/2023

Ditta: Cooperativa sociale CESDI Onlus

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

C3 – Turismo e cultura**Settore Attività culturali, turismo, musei e fondazioni.****M1C3I1.2 Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori**

CUP J47B23000000001

Settore: Attività culturali, turismo, musei e fondazioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 500.000,00

Importo autofinanziato: € 127.347,20

Inizio previsto: 19/05/2023

Fine prevista: 19/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto esecutivo lavori (del. GC n. 447 del 30/06/2023)

Aggiudicazione appalti

Affidamento diretto per lavori fibra ottica (det. n. 4704 del 22/06/2023)

Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Affidamento diretto fornitura Sgabelli per incremento fruibilità Museo Civico G. Fattori (det. n. 4704 del 22/06/2023)

Ditta: Impresa DM Cultura S.r.l.

Affidamento diretto Implementazione piano di sicurezza ed emergenza del Museo Civico G. Fattori (det. n. 4780 del 23/06/2023)

Ditta: Sokom S.r.l.

Affidamento diretto Lavori connettività di rete (det. n. 4909 del 28/06/2023)

Ditta: Associazione Culturale Prisma

Realizzazione segnaletica esterna per Museo Civico G. Fattori (det. 4933 del 29/06/2023)

Ditta: Impresa Nobili Pubblicità Sas

Affidamento diretto fornitura armadietti guardaroba accessibili (det. n. 4943 del 29/06/2023)

Ditta: Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.

Affidamento diretto realizzazione del punto informativo presso il Museo Fattori (det. n. 4944 del 29/06/2023)

Ditta: Secman Security Management S.r.l.

Affidamento diretto realizzazione di Fattori Activity Bag e realizzazione di iniziative inclusive presso il Museo Fattori (det. n. 4945 del 29/06/2023)

Ditta: Sillabe S.r.l

Affidamento diretto realizzazione di attività ed eventi volti a promuovere il tema dell'accessibilità presso il Museo Fattori (det. n. 4946 del 29/06/2023) - Acquisizione inbook (det. n. 4947 del 29/06/2023)

Ditta: Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche

Ditta: Promuseum S.r.l.

Lavori posa in opera fibra ottica al Museo Civico G. Fattori (det. n. 4969 del 29/06/2023)

Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Aggiudicazione appalto per realizzazione percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. n. 8723 del 14/11/2023)

Ditta: Betonterra Costruzioni S.r.l

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M2C4I2.2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica**Settori Urbanizzazioni, Sviluppo e manutenzioni, Impianti tecnologici****M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria Tartaruga/Puccini - Adeguamento impianto antincendio**

CUP J46B19005660004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 150.000,00

FOI: € 10.391,36

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 7996 del 02/12/2022

(ditta Martinelli Impianti S.r.l. - Ing. Luca Tocchio)

Lavori terminati

Emesso 1° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Centro infanzia La Giostra - Adeguamento impianto antincendio

CUP J42G19000850004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 150.000,00

FOI: € 9.729,29

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 8106 del 06/12/2022

(ditta Ediltec S.r.l. – ditta Maurizio Bellini)

Lavori terminati

Emesso 1° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria De Amicis - Adeguamento impianto antincendio

CUP J41E20000170004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 200.000,00

FOI: € 15.175,45

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 8103 del 06/12/2022

(ditta Control S.r.l. – Ing. Luca Tocchio)

Lavori terminati

Emesso 2° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria e infanzia d’Azeglio e Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio

CUP J41E20000180004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 100.000,00

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 4104 del 24/06/2022

(ditta Engineering Costruzioni Gruppo Empoli luce S.r.l.)

In fase di collaudo

Emesso 2° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria Carducci - Adeguamento impianto antincendio

CUP J41E20000200004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 500.000,00

FOI: € 66.858,52

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Procedura negoziata e affidamento diretto: determina n. 2738 del 02/05/2022

(ditta Dafne soc. coop. – ditta CE.BA. Ingegneria)

Lavori terminati

Emesso 1° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria Benci - Adeguamento impianto antincendio

CUP J41E20000210004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 400.000,00

FOI: € 53.198,23

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Procedura negoziata e affidamento diretto: determina n. 8105 del 06/12/2022

(ditta Seti Works S.r.l. – Dedalo Studio tecnico Roberto Masini)

Lavori terminati

Emesso 1° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta - Adeguamento impianto antincendio

CUP J41E20000220004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 200.000,00

FOI: € 30.000,00

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 7995 del 02/12/2022

(ditta Siel S.r.l. – ditta Cartesio S.r.l.)

Lavori terminati

Emesso 2° SAL

M2C4I2.2 P/M opere Scuola d'infanzia Bimbi Allegrì - Adeguamento impianto antincendio

CUP J46J20000760004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 270.000,00

FOI: € 61.647,15

Inizio previsto: 08/11/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Procedura negoziata e affidamento diretto: determina n. 8101 06/12/2022

(ditta Cat SCARL – ditta Margaret Candura)

Lavori terminati

Emesso SAL finale

M2C4I2.2 P/M opere Efficiamento energetico centrale termica palazzine RR.SS.AA.

CUP J49J21004060001

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 80.000,00

FOI: € 9.125,70

Inizio previsto: 12/08/2021

Fine prevista: 20/12/2022

Avanzamento fasi procedurali lavori

Procedura negoziata e affidamento diretto: determina n. 6772 del 08/09/2021

(ditta Impianti industriali S.r.l. – ditta Studio Clima STA)

Esecuzione lavori: dal 14/09/2021 al 29/11/2022

Collaudo: 20/12/2022

Concluso

Rendicontato entro la scadenza del 31/12/2023

M2C4I2.2 P/M opere Materna Alveare - Adeguamento impianto antincendio

CUP J43G20000230004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 175.000,00

Inizio previsto: 10/09/2021

Fine prevista: 07/12/2022

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 6847 del 10/09/2021

(ditta S.T.I.L. S.r.l. – ditta Dedalo Studio tecnico)

Esecuzione lavori: dal 14/09/2021 al 02/11/2022

Collaudo: 03/11/2022

Concluso

Rendicontato entro la scadenza del 31/12/2023

M2C4I2.2 P/M opere Nido Alveare - Adeguamento impianto antincendio

CUP J43D20001260004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 165.000,00

Inizio previsto: 31/07/2021

Fine prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte: determina n. 6777 del 08/09/2021

(ditta A&A di Amorini e Azzaro S.r.l.)

Esecuzione lavori: dal 14/09/2021 al 30/04/2023

Collaudo: 19/04/2023

Concluso

Rendicontato entro la scadenza del 31/12/2023

M2C4I2.2 P/M opere Intervento di adeguamento, trasformazione, efficientamento impianti di pubblica illuminazione, Via Montebello

CUP J49J21011820004

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 210.000,00

Inizio previsto: 15/09/2023

Fine prevista: 31/12/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicazione lavori: determina n. 6746 del 08/09/2023

(Ditta Lumar Impianti S.r.l.)

Esecuzione lavori: dal 15/09/2023 al 31/12/2024

Stato di attuazione: lavori affidati

In fase di esecuzione nei primi mesi del 2024

M2C4I2.2 P/M opere Intervento di adeguamento, trasformazione, efficientamento impianti di pubblica illuminazione

CUP J44H23000310006

Settore: Impianti tecnologici

Importo totale del finanziamento PNRR: € 210.000,00

Inizio previsto:

Fine prevista:

Avanzamento fasi procedurali lavori

Stato di attuazione: Candidato

M2C4I2.2 P/M opere Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Palazzetto dello sport PalaMacchia

CUP J48H20000150004

Settore: Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 210.000,00

Cofinanziamento: € 40.000,00

Inizio previsto: 02/12/2021

Fine prevista: 31/05/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo: Delibera G.C. n. 378 del 17/06/2022

Approvazione progetto esecutivo: Determina n. 4404 del 07/07/2022

Affidamento diretto redazione progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e procedura aperta: determina n. 4709 del 20/07/2022

Ditta MPS Studio associato

Aggiudicazione appalto: determina n. 7722 del 23/11/2022

(Ditta Tota S.r.l.)

Esecuzione lavori: dal 23/12/2022 al 29/12/2023

Collaudo: dal 29/12/2023 al 29/02/2024

Stato di attuazione: In fase di conclusione

M2C4I2.2 P/M opere Stadio comunale via dei Pensieri – Il lotto di interventi di risanamento conservativo armato

CUP J41E18000160004

Settore: Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 210.000,00

Cofinanziamento: € 290.000,00

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo (Delib. G.C. 886 del 10/12/2019 e Det. 10063 del 30/12/2019)

Aggiudicazione lavori procedura negoziata: Determina n. 4162 del 15/07/2020

(ditta NG Costruzioni ed impianti Srl)

Stato di attuazione: Concluso

Rendicontato entro la scadenza del 31/12/2023

M2C4I2.2 P/M opere Scuole Micheli II lotto, restauro facciate, piazza XI Maggio

CUP J47C19000130004

Settore: Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 600.000,00

Inizio previsto: 01/12/2020

Fine prevista: 31/08/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo (Delib. GC 602 del 01/12/2020 e Det. 8920 del 28/12/2020)

Aggiudicazione lavori: Determina n. 1188 del 15/02/2021

(Ditta Paolinelli Matteo Costruzioni S.r.l.)

Procedura negoziata e affidamento diretto servizio di coordinatore della sicurezza: Determina n. 6467 del 28/08/2021

(Ditta STR Ingegneria)

Esecuzione lavori: dal 30/06/2021 al 31/08/2023

Stato di attuazione: In fase di conclusione

Lavori collaudati a marzo 2024

M2C4I2.2 P/M opere Sistemazione area fluviale ASIP - zona Magrignano

CUP J41B21011890004

Settore: Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.7000.000,00

Avanzamento fasi procedurali lavori

Progettazione affidata nel 2021 (det. n. 9759 del 30/12/2021 e det. n. 9779 del 31/12/2021)

(Ditte: Geologo Carlo Rafanelli / RTP Ing. Stefano Pagliara e Ing. Massimo Ascoli)

Collaudo: dal 01/12/2025 al 27/02/2026

Stato di attuazione: progettazione affidata

M2C4I2.2 P/M opere Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci

CUP J47H21001540004

Settore: Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità

Importo totale del finanziamento PNRR: € 730.000,00

Cofinanziamento: € 2.270.000,00

Avanzamento fasi procedurali lavori

Progettazione definitiva (D. GC. n. 703 del 30/12/2021)

Progettazione esecutiva (det. n. 9757 del 30/12/2021)

(Ditta: Studio di Ingegneria delle Strutture di Andrea Cecconi, Sandro Pustorino, Fabrizio Ristori & Associati)

Collaudo: dal 02/01/2026 al 02/03/2026

Stato di attuazione: approvato progetto esecutivo

Avviata procedura di gara nei primi mesi del 2024

.....

M4 – Istruzione e Ricerca

C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università
Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzione

M4C1 I1.1 Rifunionalizzazione scuola infanzia via Poerio (scuola ex Ciro Menotti) come centro polifunzionale per la famiglia

CUP J44E21001030001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.170.000,00

Inizio previsto: 22/03/2021

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo in linea tecnica (deliberazione GC n. 247 del 20/05/2021)

Affidamento diretto servizio di verifica del progetto definitivo: Ing. Petrucci Simone

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4581 del 20/06/2023)

(Ditta: Consorzio Italiano Costruzioni e Manutenzioni Società Cooperativa)

Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025

Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M4C1 I1.1 Asilo nido Pirandello, via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture

CUP J45E22000000006

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.896.000,00

Cofinanziamento comunale: € 844.000,00

Inizio previsto: 01/12/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE rafforzato (ord. n. 3325 del 11/05/2023)

Affidamento diretto redazione PFTE: RTP architetto Pietro Carlo Pellegrini, Studio Archimede Ingegneria S.r.l. e Dott. Francesco Saviozzi

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4577 del 20/06/2023)

(Ditta: Edil Fab S.r.l.)

Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M4C1 I3.3 Realizzazione nuova scuola secondaria I grado Mazzini – via Sgarallino

CUP J41B22002240006

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 5.280.000,00

Inizio previsto: 20/01/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE in linea tecnica (deliberazione GC n. 30 del 20/01/2023)

Approvazione DIP (delibera GC n. 527 del 18/08/2023)

Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/03/2026

Stato di attuazione: in fase di approvazione PFTE

M4C1 I3.3 Polo scolastico di Montenero – realizzazione di un nuovo centro infanzia 0-6 anni

CUP J41B22001690006

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.520.000,00

Inizio previsto: 18/05/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione DIP (delibera GC n. 541 del 18/08/2023)

Approvazione PFTE in linea tecnica

Collaudo: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Stato di attuazione: in fase di approvazione PFTE

M4C1 I3.3 Polo scolastico di Montenero – nuova scuola primaria e secondaria di I grado

CUP J41B22001680006

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del progetto: € 10.439.999,96

Importo finanziamento PNRR: € 2.168.757,76

Importo autofinanziato: € 8.271.242,20

Inizio previsto: 30/06/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione DIP (delibera GC n. 541 del 18/08/2023)

Approvazione PFTE in linea tecnica

Collaudo: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Stato di attuazione: in fase di approvazione PFTE



M5 Inclusione e coesione

C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzione

M5C2 I3.1 Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia, via San Martino

CUP J45B22000400006

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.500.000,00

FOI: € 350.000,00

Cofinanziamento comunale: € 800.000,00

Inizio previsto: 07/11/2022

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE e PFTE rafforzato (delib.GC n. 819 del 23/12/2022 e n. 108 del 22/02/2023)

Affidamento diretto redazione della verifica preventiva di interesse archeologico

(Ditta: Past in Progress S.r.l.)

Affidamento diretto relazione geologica ed esecuzione indagini

(Ditta: Geologica Toscana Snc)

Affidamento diretto realizzazione render

(Ditta VIR94 Lab. Archiviz.)

Procedura aperta per affidamento di appalto integrato

(Ditta: Frangerini Impresa S.r.l.)

Aggiudicazione (det. n. 2205 del 30/03/2023) aggiudicazione efficace (det. n. 3840 del 29/05/2023)

Esecuzione lavori: dal 01/12/2023 al 30/10/2025

Collaudo: dal 01/11/2025 al 31/01/2026

Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana Baden Powell – Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell

CUP J44E21001000001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.000.000,00

FOI: € 200.000,00

Inizio previsto: 12/04/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (deliberazione GC n. 272 del 01/06/2021)

Approvazione progetto definitivo (deliberazione GC n. 300 del 12/05/2023)

Approvazione progetto esecutivo (determina dirigenziale n. 4410 del 24/06/2023)

Affidamento diretto verifica preliminare del progetto esecutivo

(Ditta: Avalon S.r.l.)

Aggiudicazione appalto (det. n. 5785 del 28/07/2023) Procedura aperta

(Ditta: Euroambiente S.r.l.)

Esecuzione lavori: termine 31/03/2026
Collaudo: 30/06/2026
Stato di attuazione: in fase di esecuzione

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero - riqualificazione immobili quartiere stazione e pavimentazione isolato quartiere Stazione

CUP J47B22000060001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 13.196.000,31

FOI: € 2.199.333,31

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro 08/08/2022;

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 1

(Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 2 – servizi di verifica della progettazione

(Ditta: Planum S.r.l.)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 5 – servizi di collaudo

(Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandatario) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Minutolo Ing. Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato

(Ditta: Apulia S.r.l. (mandataria), Pagano Spa (mandante)

Approvato progetto definitivo e bozza ODA: Delibera GC 849 del 05/12/2023

Aggiudicazione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori: determina n. 10331 del 28/12/2023 (RTI APULIA S.R.L mandataria - PAGANO S.P.A. mandante - DELTA LAVORI S.P.A. mandante)

Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione: Aggiudicato appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – quartiere Stazione Parco Pertini

CUP J43D21002660001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.639.722,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE: Delibera GC n. 851 del 07/12/2023

Gara deserta

Nuova determina a contrarre procedura negoziata: determina n. 10403 del 29/12/2023

Esecuzione lavori: entro il 30/06/2025

Collaudo: dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Stato di attuazione: gara deserta, nuova determina a contrarre

Aggiudicati i lavori nei primi mesi del 2024

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – parcheggio Del Corona

CUP J47H21000370001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.323.654,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Servizio supporto al RUP: determina n. 7546 del 06/10/2023

(Ditta: Avalon s.r.l.)

Servizio di indagini geognostiche e geofisiche: determina n. 8359 del 03/11/2023

(ASSOGEO – STUDIO DI GEOLOGIA di Antonio Esposito)

Servizio di indagini strutturali e per l'esecuzione di prove di laboratorio: determina n. 8363 del 03/11/2023

(Ditta: Laboratorio Delta S.r.l.)

Approvazione progetto esecutivo: Delibera GC n. 859 del 07/12/2023

Aggiudicazione appalto lavori: determina n. 10402 del 29/12/2023

(Ditta: Abate s.r.l.)

Esecuzione lavori: dal 01/04/2024 al 31/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Stato di attuazione: Aggiudicato appalto di lavori

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Dogana D'Acqua completamento del recupero e rifunzionalizzazione ex caserma Lamarmora

CUP J43D21002630001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 8.563.918,85

FOI: € 1.712.783,77

Importo autofinanziato: €2.000.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro 31/03/2023

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione

(Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini)

Affidamento diretto a società in house servizio di rimozione rifiuti

(Ditta: AAMPS Spa)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione

(Ditta: Conteco Check S.r.l.)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo

(Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandatario) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato

(Consorzio Stabile Medil Società consortile per azioni)

Servizio supporto al RUP: determina n. 7546 del 06/10/2023

(Ditta: Avalon s.r.l.)

Approvato progetto definitivo e approvata bozza ODA: Delibera GC n. 839 del 05/12/2023

(Consorzio stabile Medil società consortile per azioni - CO.GE.PA. costruzioni generali Passarelli S.p.a. esecutrice- Nord costruzioni Generali s.r.l. esecutrice)

Aggiudicazione appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori: determina n. 10356 del 28/12/2023

(Consorzio stabile Medil società consortile per azioni)

Esecuzione lavori: entro il 31/03/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/06/2026

Stato di attuazione: Aggiudicato appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

M5C2I2.3.1 PINQuA ambito Dogana D'Acqua realizzazione edificio polifunzionale Cral e realizzazione Piazza con giochi d'acqua

CUP J45I22000000001

Settore: Sviluppo, valorizzazione, manutenzioni

Importo totale del finanziamento PNRR: € 4.380.486,41

FOI: € 876.097,28

Importo autofinanziato: €400.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicazione accordo quadro 27/09/2022

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione

(Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione
(Ditta: CONTECO Check S.r.l.)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo
(Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandataria) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 3. Lavori
(Ditta: Edilcido S.r.l.)

Servizio supporto al RUP: determina n. 7546 del 06/10/2023

(Ditta: Avalon s.r.l.)

Approvazione progetto esecutivo e bozza ODA: Delibera GC n. 858 del 07/12/2023

Aggiudicazione del contratto specifico di esecuzione lavori: determina n. 10371 del 29/12/2023

(Ditta: EDILCIDO S.R.L.)

Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione: Aggiudicato appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

M5 Inclusione e coesione

C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzione

M5C2I1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e bambini

CUP J44H22000200006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 211.500,00

Inizio previsto: 09/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto servizio: determina n. 5009 del 30/06/2023

(Ditta: Nuovo Futuro Cooperativa sociale)

Stato di attuazione: servizio affidato e gestione avviata in data 03/07/2023

M5C2I1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

CUP J44H22000210006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.460.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE per ristrutturazione immobile Villa Serena: Delibera GC n. 664 del 10/10/2023

Servizio per redazione del PFTE e progettazione esecutiva a supporto della progettazione: determina n. 9381 del 04/12/2023

(Geom. Vasile Sebastian)

Stato di attuazione: gestione avviata; progetto concluso

M5C2I1.1.2 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione

CUP J44H22000220006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 330.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione socio-sanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in virtù dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del Sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" CUP J44H22000220006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" approvato con Delibera di Giunta 455 del 7/07/23 e della Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.8 del 10 luglio 2023

Stato di attuazione: attività in corso

M5C2I1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali

CUP J44H22000230006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 209.976,80

Inizio previsto: 02/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio tecnico e di segreteria per la realizzazione dell'investimento: determina n. 9943 del 06/12/2023

(Ditta: CON TE Cooperativa Sociale ONLUS)

Stato di attuazione: dichiarazione inizio attività; gestione avviata

M5C2I1.1.4 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

CUP J44H22000240004

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto servizio supporto organizzativo: determina n. 8344 del 13/12/2022

(Ditta: Progetto A. Società Cooperativa Sociale)

Esecuzione servizi: da dicembre 2022 al 30/06/2023

Stato di attuazione: gestione avviata (concluso affidamento diretto sperimentale)

Il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. Per l'azione di GESTIONE la prima procedura realizzata e conclusa concerneva l'avviamento sperimentale della gestione affidato a decorrere da dicembre 2022 fino al 30/06/2023 con Determinazioni del Dirigente del Settore Politiche Sociali n. 8344 del 13/12/2022 e n. 2884 del 27/04/2023.

M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità AUSL

CUP J44H22000320006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicazione: accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 con Azienda USL Nord Ovest

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione sociosanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in forza dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP J44H22000320006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" approvato con Decreto Direttoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3853 del 2/12/2022, con Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.18 del 23/12/2022 e con Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 31/01/2023

Stato di attuazione: gestione avviata

Nella sua esecuzione il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. La prima procedura avviata concerne la gestione per la realizzazione della quale è stato pubblicato in data 9/02/23 un avviso pubblico di manifestazione di interesse per una procedura di coprogettazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 approvato con decreto del Direttore di Zona USL n.531 del 9/02/23. Nell'ambito della procedura di coprogettazione con decreto n. 1427 del 3/05/2023 è stato approvato il verbale di ammissione dei candidati alla coprogettazione e convocato il tavolo di coprogettazione.

M5C2I1.3.1 Povertà estrema - Housing first

CUP J44H22000250006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 710.000,00

Cofinanziamento: € 587.443,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Gestione non ancora avviata

Stato di attuazione: firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo- invio Dichiarazione di inizio attività.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Approvazione PFTE (del. GC n. 267 del 02/05/2023)
Aggiudicazione (det. n. 3157 del 08/05/2023 e det. n. 3841 del 29/05/2023)
(Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini)
Affidamento servizio assistenza indagini strutturali e all'aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati: det. 5376 del 13/07/2023 e det. 8161 del 27/10/2023
(Ditta: F.Ili Colloca snc e Labromare S.r.l.)
Stato di attuazione: gestione e lavori da avviare

M5C2I1.3.1 Povertà estrema – Stazioni di posta

CUP J44H22000260006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.090.000,00

Cofinanziamento: € 142.557,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Aggiudicazione: entro il 31/12/2023

Gestione non ancora avviata

Stato di attuazione: firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo-invio Dichiarazione di inizio attività.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Approvazione PFTE (del. GC n. 267 del 02/05/2023)

Aggiudicazione (det. n. 3157 del 08/05/2023 e det. n. 3841 del 29/05/2023)

(Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini)

Affidamento servizio assistenza indagini strutturali e all'aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati: det. 5376 del 13/07/2023 e det. 8161 del 27/10/2023

(Ditta: F.Ili Colloca snc e Labromare S.r.l.)

Stato di attuazione: gestione e lavori da avviare

(I dati sono stati ricavati dal sistema informativo ReGis alla data del 31 dicembre 2023 e dalle informazioni fornite dai Settori interessati)

Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti

M1C1 --> n. 7 interventi	
n. 1 in fase di affidamento	(Piattaforma digitale nazionale dati)
n. 2 aggiudicato	(Cloud e servizi e cittadinanza digitale)
n. 2 in fase di esecuzione	(Rete dei servizi di facilitazione digitale e ApplO)
n. 2 conclusi	(PagoPAe Piattaforma notifiche digitali)
M1C3 --> n. 1 intervento	
n. 1 in fase di esecuzione	(rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali Museo Civico Fattori)
M2C4 --> n. 18 interventi	
n. 1 candidato	(efficientamento impianti di illuminazione)
n. 1 progettazione affidata	(sistemazione area fluviale ASIP- Borgo Magrignano)
n. 1 approvato progetto esecutivo	(consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci)
n. 1 in fase di esecuzione	(efficientamento impianti di illuminazione)
n. 2 in fase di conclusione	(Facciate scuole Micheli e PalaMacchia)
n. 7 Lavori terminati	(adeguamento antincendio scuole Tartaruga/Puccini, la Giostra, De Amicis, Carducci, Benci, Bimbi Allegri, Lambruschini/Rosetta)
n. 1 in fase di collaudo	(D'Azeglio/Santa Barbara)
n. 4 Conclusi	(efficientamento energetica RR.SS.AA, adeguamento antincendio per Nido e Materna Alveare, risanamento conservativo Stadio Il lotto)
M4C1 --> n. 5 interventi	
n. 3 in fase di progettazione	(nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino e Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero e 6-14)
n. 2 in fase di esecuzione	(Rifunzionalizzazione scuola infanzia Via Povero e demolizione e ricostruzione Asilo nido Pfrandello)
M5C2 --> N. 15 interventi*	
n. 4 in fase di progettazione	(Immobile housingfirst e stazione di posta, immobile per percorsi di autonomia per persone con disabilità, immobile per autonomia degli anziani non autosufficienti)
n. 4 aggiudicata progettazione esecutiva e appalto lavori	(PINQuA: quartiere stazione, parcheggio Via del Corona, CRAL e giochi d'acqua, ex caserma Lamarmora)
n. 1 gara deserta	(PINQuA: Parco Pertini)
n. 2 in fase di esecuzione	(Realizzazione nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopai e Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell)
n. 6 gestioni avviate	(Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, autonomia degli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out, percorsi di autonomia per persone con disabilità e ausl)
n. 2 gestioni da avviare	(Housingfirst, stazioni di posta)

*(di cui 4 interventi del sociale riguardano solo gestione e altri 4 sia gestione che lavori)

candidato		1
in fase di progettazione		7
progettazione affidata		1
progettazione approvata		1
in fase di affidamento		1
aggiudicati		6
gara deserta		1
in fase di esecuzione		8
in fase di conclusione		2
lavori terminati		7
in fase di collaudo		1
conclusi		6
gestioni avviate		6
gestioni da avviare		2

4. ANDAMENTO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PNRR

Nella *Tabella 4* si illustra l'andamento di cassa relativo agli esercizi 2021/2023, nel quale si evidenzia che nel 2022 il Comune di Livorno ha ricevuto la quota maggiore dei trasferimenti PNRR, introitati sulla base del DM 11 ottobre 2021, il quale prevede che l'erogazione della prima quota di trasferimenti sia anticipata rispetto alla realizzazione delle spese per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento (o altra percentuale motivata dall'Amministrazione titolare dell'intervento), proprio per consentire la realizzazione tempestiva dei progetti.

TOTALE REVERSALI TRIENNIO 2021/2023	TOTALE LIQUIDATO TRIENNIO 2021/2023	TOTALE PAGATO TRIENNIO 2021/2023
7.474.394,05	3.425.378,87	3.328.064,90

SALDO 4.146.329,15

Il maggior impatto sulle casse dell'Ente si avrà presumibilmente nell'esercizio 2024, quando si perfezioneranno quasi tutte le obbligazioni di spesa legate ai trasferimenti PNRR e le restanti erogazioni ministeriali seguiranno invece la corretta e tempestiva implementazione del sistema Regis da parte dell'Ente.

Questa inversione di tendenza dei flussi finanziari potrebbe dunque comportare la necessità che l'Ente sopperisca con cassa propria ai pagamenti relativi ad opere PNRR.

Occorre precisare che nella tabella sono riportati i flussi finanziari in entrata e in uscita relativamente a quegli interventi che hanno già ricevuto l'acconto da parte delle Amministrazioni titolari di riferimento o che hanno già effettuato pagamenti a favore dei soggetti aggiudicatari dei lavori, servizi o forniture a seguito del decreto di finanziamento ministeriale che ha comunque permesso l'accertamento delle entrate.

Nella **tabella n. 5** di seguito riportata si illustra l'andamento di cassa delle annualità 2021/2023

Interventi	ENTRATA			USCITA					
	reversali			liquidazioni			pagamenti		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Effici. energetico RR.SS.AA. CUP J49J21004060001	40.000,00	0,00	9.125,70	0,00	66.610,05	10.101,96	0,00	66.610,05	10.101,96
Antinc. Materna Alveare CUP J43G20000230004	87.500,00	0,00	0,00	11.401,13	89.162,58	20.784,08	11.401,13	89.162,58	20.784,08
Antinc. Nido Alveare CUP J43D20001260004	82.500,00	0,00	0,00	10.250,42	0,00	78.911,35	10.250,42	0,00	78.911,35
Antinc. Tartaruga/Puccini CUP J46B19005660004	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	88.535,89	0,00	0,00	88.535,89
Antinc. La Giostra CUP J42G19000850004	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	17.824,32	51.287,13	0,00	17.824,32	51.287,13
Antinc. De Amicis CUP J41E20000170004	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	121.867,07	0,00	0,00	89.645,97
Antinc. d'Azeglio/Santa Barbara CUP J41E20000180004	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	63.704,50	0,00	0,00	63.704,50	0,00
Antincendio Carducci CUP J41E20000200004	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	29.600,69	231.783,67	0,00	29.600,69	231.783,67
Antincendio Benci CUP J41E20000210004	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	28.135,83	172.338,46	0,00	28.135,83	172.338,46
Antinc. Lambruschini/Rosetta CUP J41E20000220004	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	17.373,97	67.747,91	0,00	17.373,97	67.747,91
Riquai. energetica Bimbi Allegri CUP J46J20000760004	0,00	54.000,00	27.000,00	0,00	14.780,85	180.404,38	0,00	0,00	173.645,14
Scuole Micheli CUP J47C19000130004	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	237.261,93	0,00	0,00	237.261,93
Baden Powell CUP J44E21001000001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINQuA quartiere stazione CUP J47B22000060001	0,00	1.099.666,66	0,00	0,00	0,00	355.384,22	0,00	0,00	355.384,22
PINQuA Parco S. Pertini CUP J43D21002660001	0,00	263.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINQuA parch. Via Del Corona CUP J47H21000370001	0,00	132.365,45	0,00	0,00	0,00	18.658,87	0,00	0,00	18.658,87
PINQuA ex Caserma Lamarmora CUP J43D21002630001	0,00	856.391,89	0,00	0,00	0,00	349.079,02	0,00	0,00	349.079,02
PINQuA CRAL CUP J45I22000000001	0,00	438.048,64	0,00	0,00	0,00	78.340,08	0,00	0,00	71.386,08
Impianto poliv. Scopaia CUP J45B22000400006	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	56.641,22	0,00	0,00	56.641,22
Centro polif. Via Poerio CUP J44E21001030001	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	15.861,70	0,00	0,00	15.861,70
Stadio Comunale CUP J41E18000160004	0,00	105.000,00	0,00	159.709,72	326.487,84	0,00	159.709,72	326.487,84	0,00
Asilo Pirandello CUP J45E22000000006	0,00	0,00	568.800,00	0,00	0,00	45.763,10	0,00	0,00	45.763,10
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini P.I.P.P.I. CUP J44H22000200006	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percorsi di auton. persone con disabilità CUP J44H22000240004	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	31.496,62	0,00	0,00	31.496,62
Percorsi di auton. persone con disabilità CUP J44H22000320006	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali CUP J44H22000230006	0,00	0,00	20.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione AUSL CUP J44H22000220006	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autonomia degli anziani non autosufficienti CUP J44H22000210006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279,70	0,00	0,00	15.279,70
Magrignano CUP J41B21011890004	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Falucci CUP J47H21001540004	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60
Palamacchia* CUP J48H20000150004	0,00	0,00	105.000,00	0,00	10.084,47	137.864,55	0,00	10.084,47	137.864,55
Housing first CUP J44H22000250006	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	33.981,26	0,00	0,00	33.981,26
Stazioni di posta CUP J44H22000260006	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	35.368,25	0,00	0,00	35.368,25
Rimozione barriere fisiche cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori *Via San Jacopo in Acquaviva* rimozione barriere architettoniche e acquisizione di strumenti digitali per disabili CUP J47B23000000001	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.268,48	0,00	0,00	12.669,70
Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino CUP J41B22002240006	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero CUP J41B22001690006	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero primaria e secondaria di 1° grado CUP J41B22001680006	0,00	0,00	216.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.000,00	4.393.444,89	2.870.949,16	181.361,27	663.765,10	2.580.252,50	181.361,27	648.984,25	2.497.719,38

5. I risultati attesi: l'impatto dell'operazione e il valore pubblico

Come si evince dai dati relativi allo stato di avanzamento dei progetti, nel 2023 il processo attuativo del "PNRR locale" è entrato nel vivo, imponendo di spostare l'attenzione sul monitoraggio fisico degli interventi programmati e, per questa via, sulla connessa "domande chiave":

L'Amministrazione Comunale sta centrando i propri target? L'"operazione PNRR" sta rispondendo alle attese? In che misura sta impattando e impatterà sulla vivibilità dell'*Urbe* e sul benessere dei suoi residenti?

E d'altra parte i dati contabili ed economico-finanziari sin qui rappresentati e monitorati acquisiscono senso solo attraverso la risposta a questi interrogativi.

Di qui l'esigenza di un primo, introduttivo e generale riepilogo dei risultati attesi, a regime ed in itinere, quale area di attenzione imprescindibile per promuovere, insieme alle ordinarie attività di verifica, monitoraggio e controllo, la valutazione degli esiti dell'investimento e il relativo processo di accountability.

Per entrare in questa prospettiva va detto in primo luogo che l'attuazione dei Progetti finanziati o co-finanziati con risorse Next generation EU non deve essere concepita in modo frammentario, ma piuttosto come un'unica **grande operazione di rigenerazione urbana** destinata ad impattare positivamente sulla vita comunitaria e il benessere della generalità dei cittadini, sotto il profilo ambientale, sociale, nonché, in forza dell'occupazione indotta, economico-occupazionale, migliorando l'efficacia e gli esiti dei pregressi programmi di investimento dell'ente.

In linea con le missioni, le priorità di investimento e i vincoli del PNRR nazionale, la prevalenza dei progetti (ben 35 su un tot. di 45) prevede infatti la realizzazione di opere di riqualificazione e recupero di edifici e spazi pubblici destinate a migliorare la qualità dell'abitare e la vivibilità dell'*Urbe* in termini di compatibilità ambientale e adeguamento agli standard inerenti ai parcheggi, all'aumento degli spazi di aggregazione, alla fruibilità delle aree verdi e degli impianti sportivi, nonché funzionali a potenziare e qualificare l'offerta di servizi sociali e socio-educativi, a promuovere la fruibilità di quelli culturali e, infine ma non ultimo, la funzionalità degli ambienti e degli edifici scolastici insieme alla qualità della relativa offerta formativa.

Ciò ovviamente, in coerenza con l'approccio tipico dell'"urban regeneration", a partire dai quartieri più disagiati e con tutte le conseguenti, attese ricadute sulla coesione sociale e il benessere della generalità dei residenti.



Nel complesso il valore di dette opere assorbe il **93,59% del budget** dei 45 progetti candidati e ammessi a finanziamento sulle risorse Next generation EU e a decorrere dal 2023, al netto di alcune piccole e medie opere oggi stralciate dal Piano nazionale e di un intervento di riqualificazione riguardante un immo-

bile di proprietà A.usl da realizzarsi mediante la stessa proprietaria partner di progetto, confluisce nel P.T.LL.PP. del Comune, incrementando sensibilmente il relativo elenco annuale, ma anche, data la complementarietà di una parte della progettualità PNRR con gli interventi precedentemente programmati e interamente finanziati con risorse proprie, promettendo di migliorarne, insieme alle attese ricadute, la capacità di generare valore pubblico.

Tale capacità è tanto più evidente se si considera che la restante progettualità del "PNRR Comunale" è finalizzata ad integrare e potenziare l'efficacia e il potenziale impatto del suddetto, importante investimento "infrastrutturale" attraverso gli interventi immateriali finalizzati all'innovazione e alla facilitazione digitale di competenza dei sistemi informativi (2,46% del budget complessivo dell'operazione), le azioni di valorizzazione dei beni culturali museali previste dai progetti di competenza del settore Cultura (0,52% dell'investimento) e le attività di qualificazione e miglioramento della capacità di risposta dei processi di inclusione sociale delle fasce più fragili della popolazione previste dai progetti di competenza del Settore politiche sociali e socio-sanitarie (3,43 dell'investimento complessivo).

Nel loro insieme gli "interventi PNRR" confluiti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici e le ormai concluse piccole e medie opere oggi stralciate dal Piano interessano una superficie a terra pari a **90.460 mq**, coinvolgono direttamente ampie fasce e diversi target di popolazione residente ed andranno a produrre benefici per la generalità dei cittadini con un **duplice valore aggiunto**:

- il **basso consumo di suolo pubblico**, dal momento che nel loro insieme le opere PNRR, una volta realizzate, garantiranno una variazione a saldo del consumo di suolo prossima allo 0, con un incremento del terreno edificato atteso pari ad appena **+ 283 mq. (+ 0,3%)**, contro un incremento di aree verdi e spazi aperti pari a **+ 22.652 mq**. In linea con la logica e le finalità tipiche dell'"*Urban regeneration*" la prevalenza degli interventi punta infatti al recupero, alla riqualificazione e alla ri-funzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l'effetto di limitare ad appena l'8,8% la superficie interessata da interventi nuova costruzione, che peraltro, come gli altri, in coerenza col principio del DNSH, rispondono ad un orientamento progettuale attento a limitare il consumo di suolo.
- il "**guadagno**" in termini di **sostenibilità ambientale e risparmio energetico**, frutto di una progettazione orientata, non solo a limitare il consumo di territorio, ma anche a privilegiare per le ricostruzioni e ri-funzionalizzazioni strutturali, le fonti energetiche rinnovabili, l'impiego di materiali ecologici ed ogni altro accorgimento atto a limitare e prevenire danni all'ambiente. Il risparmio energetico rappresenta un primo significativo indicatore della compatibilità ambientale degli interventi PNRR. Il relativo valore, infatti, benché allo stato attuale sia calcolato e disponibile unicamente per 3 delle opere programmate e pertanto ancora molto parziale ammonta già a -363,7 Kw.

Per quanto riguarda **la popolazione target e i destinatari diretti** dei progetti realizzati e/o in corso di realizzazione con il concorso delle risorse Next Generation EU (ovvero gli specifici target di progetto) possiamo raggruppare gli obiettivi e i relativi, principali indicatori di risultato atteso in 4 macro-aggregati:

- Obiettivi finalizzati a garantire la piena sicurezza, adeguatezza e funzionalità degli ambienti e delle strutture scolastiche e educative per la 1° infanzia (di cui alle M4C1 e M2C1), che interessano direttamente il **20,7% della popolazione nella fascia di età 0-14 anni**, pari a 3.630 individui, di cui il 68% già raggiunti dai conclusi progetti di realizzazione delle piccole e medie opere di adeguamento a norma e efficientamento energetico degli impianti anti-incendio e di fornitura finanziati sulla M2C1, oggi stralciati dal PNRR;

- Obiettivi di miglioramento della qualità dell'abitare della popolazione residente in complessi abitativi del patrimonio ERP, a partire da quella dei quartieri più degradati, finalizzati a raggiungere l'**11,53% della popolazione target (inquilini ERP)**, pari a tot. 171 nuclei familiari residente in immobili ERP del quartiere Stazione;
- Obiettivi di qualificazione e potenziamento della capacità di risposta del sistema di welfare locale, con specifico riferimento ai percorsi di inclusione della rete dei servizi sociali, di cui alle dedicate misure della Missione 5, e ai servizi socio-educativi e di riconciliazione per le famiglie con bambini nella fascia di età 0-6 anni (Nido e Centri-famiglia), di cui alle specifiche misure della Missione 4, con il risultato atteso del miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza, dei processi assistenziali e educativi, ma anche di un notevole incremento della dotazione di posti. Quest'ultimo è infatti atteso pari a **+ 352 posti disponibili per le popolazioni target (output)**, di cui 295 per l'infanzia 0-6 anni e le relative famiglie e 65 per l'utenza in carico ai servizi sociali, e qui prioritariamente per le persone in condizioni di alta marginalità o ridotta autonomia (anziani e disabili) aventi titolo ad accedere a percorsi e risposte di assistenza residenziale e/o di Edilizia residenziale sociale (ERS);
- Obiettivi di valorizzazione e promozione della fruibilità dei beni culturali (con particolare riferimento a quelli museali), delle opportunità digitali, degli impianti sportivi e degli spazi verdi e per il tempo libero accessibili alla **generalità dei cittadini**, che, finalizzati a migliorare la qualità del vivere urbano e il benessere della comunità tutta, interessano la totalità della popolazione residente, a partire da quella che vive nelle zone interessate.

Si riassumono sotto, per macroaggregati, i valori dei principali risultati attesi sul fronte dell'output, rilevando che il "pacchetto di progetti" in esame è destinato a produrre importanti benefici per la generalità dei cittadini, coinvolgendo direttamente 3 residenti ogni 100.

superficie (mq) interessata da opere di valorizz.	variazione mq terreno edificato	variazione spazi aperti e aree verdi	risparmio energetico annuo (Kw)*	Destinatari		incremento utenti serviti e/o posti disponibili
				tipo	Q	
90.460	283	22.652	-363,7	residenti direttamente interessati	4.609	360
* dato parziale					↓	3,0% pop. residente

Si tratta di misure che evidenziano la dimensione e il carattere sfidante dell'operazione PNRR" a livello locale, ma anche dei target di progetto che l'ente attuatore è tenuto a rispettare insieme ai miles stones ai fini del pieno riconoscimento dei ristori a valere sul finanziamento accordato e che pertanto, con appositi codici e diverse denominazioni, analogamente ai cronoprogrammi, sono **soggetti a monitoraggio sul sistema ReGIS**.

Non solo. I suddetti dati *fisici*, insieme a quelli economico-finanziari, costituiscono anche e soprattutto la **base informativa utile per la definizione del set minimo di indicatori da impiegare nel 2026 per la valutazione d'impatto e la misurazione del valore pubblico** generato dall'attuazione dei "Progetti PNRR" e, gioco forza, dalla confluenza della relativa progettualità, integrativa e in molti casi complementare, nell'ambito del più ampio programma di investimenti dell'ente.

Nella pagina successiva si riportano, disaggregati per progetto ammesso a finanziamento sul PNRR, i valori dei principali indicatori-target sopra esaminati.

Indicatori target disaggregati per progetto

Rif. Linea investimenb PNRR	CUP	Denominazione Progetto	superficie interessata dall'intervento (mq)	variazione mq terreno edificab	variazione spazi aperti e aree verdi	risparmio energetico annuo (Kw)	Destinatari (beneficiari diretti)		incremento uteni servizi e/o posti disponibili	
							tipo	Q		
M4C1	3.3	J41B22002240006	Nuova Scuola sec1°grado Sgarallino	4.960	228			alunni attesi	200	
M4C1	3.3	J41B22001690006	Polo scolastico Montenero Centro Infanzia -	1.050	1.050	0		frequentanti 0-6 anni attesi	135	135
M4C1	3.3	J41B22001680006	Polo scolastico Montenero Scuole primaria e sec.1° g.	4.350	2.040	2.310		alunni attesi	425	
M4C1	1.1	J45E22000000006	Ricostruzione Nido Pirandello	1.000	923		-210	frequentanti 0-3 anni attesi	60	60
M4C1	1.1	J44E21001030001	rifunzionalizzazione Scuola Infanzia V. Poerio	1.915	0	0	-130	frequentanti 0-6 anni attesi	100	100
M2C4	2.2	10 Prog.conclusi	Adeguamento impianti e riqualificazione energetica	0		0		bambini e alunni frequentanti 0-14 anni	2.471	
M2C4	2.2	J47C19000130004	Rifacimento facciate Scuola Micheli	0		0		alunni frequentanti	239	
sub.tot.Ob.Adeguamento edifici e ambienti scolastici			13.275	4.241	2.310	-340		pop.0-14 anni interessata	3.630	295
M1C3	1.2	J47B23000000001	Rimozione barriere Museo Fattori					Cittadini con disabilità		
M2C4	2.2/	J48H20000150004	Palamacchia	3.000	0			tot. pop. Residente		
M2C4	2.2	J41E18000160004	Risanamento Stadio	12.000	0			tot. pop. residente		
M5C2	3.1	J45B22000400006	Costruzione nuovo impianto sportivo polivalente Scopaia	2.586	1.613			tot. pop. Residente	200	
M5C2	2.3	J47B22000060001	PINQUA-riqualificazione quartiere Stazione	17.896	0	961		nuclei fam. inquilini ERP	171	
M5C2	2.3	J43D21002630001	PINQUA-Rifunz. Caserma La Mamora	4.351	0	0	-23,69	utenti servizi sociali	18	18
M5C2	2.3	J47H21000370001	PINQUA - Parcheggio DelCorona	4.800	0	0		utilizzatori posti auto	155	
M5C2	2.3	J45I22000000001	PINQUA-CRAL e giochi d'acqua	3.044	-2.575	2.444		Residenti		
M5C2	2.3	J43D21002660001	PINQUA-Riqualificazione Parco Pertini	2.175	-3.054	11.063		tot. pop. Residente		
M5C2	2.1	J44E21001000001	Ampliamento Parco Baden Powell	24.750	0	5.874		tot. pop. Residente		
ub.tot. Ob. Rigenerazione urbana e coesione sociale			74.602	-4.016	20.342	-23,7		nuclei fam. residenti	544	18
M5C2	1.1. 2	J44H22000240004	Percorsi per l'autonomia dei disabili	397				utenti servizi sociali	12	12
M5C2	1.1.2	J44H22000320006	autonomia disabili (gestione A.usl)					utenti servizi sociali	12	12
M5C2		J44H22000210006	Percorsi per l'autonomia degli anziani n.a.	777	58			utenti servizi sociali	125	8
M5C2	1.3. 1	J44H22000250006	Housing-first	696				utenti servizi sociali	15	15
M5C2	1.3. 1	J44H22000260006	Stazioni di posta	713				utenti servizi sociali	82	
M5C2	1.1.	J44H22000200006	Sostegno capacità genitoriale					nuclei familiari con minori	30	
M5C2	1.1.	J44H22000220006	rafforz. Serv.Dom. (gestione A.usl)					utenti servizi sociali	100	
M5C2	1.1.4	J44H22000230006	prevenzione burn out operatori					operatori sociali	59	
ub.tot. Ob. Inclusione sociale dei cittadini più fragili			2.583	58				Utenti dei servizi soc.	435	47
			90.460	283	22.652	-363,7		pop.target (destinatari diretti)	4.609	360

I suddetti risultati attesi assumono tanta più rilevanza se si considera che in diversi casi i benefici prodotti sono destinati ad aumentare ulteriormente per effetto della messa a terra degli interventi programmati dal P.T.LL.PP. che si pongono in stretta connessione con quelli ammessi a finanziamento sul PNRR. Tra questi si segnalano in particolare i seguenti:

- La sistemazione delle aree esterne del Nido Pirandello;
- L'aumento delle dotazioni sportive dell'impianto della Scopaia;
- La demolizione degli edifici del Parco Pertini, che andrà ad aumentare ulteriormente e sensibilmente il verde fruibile;

- La sistemazione della copertura e dei paramenti del PalaMacchia, a completamento degli interventi di valorizzazione dell'impianto;
- Il Parco sportivo adiacente al nuovo impianto della Scopaia.

6. INTERVENTI PNRR MESSI A TERRA NEL COMUNE DI LIVORNO E NEL TERRITORIO PROVINCIALE E LIMITROFO TRAMITE LE SOCIETÀ ED ENTI DEL G.A.P.

a) Interventi PNRR sul territorio comunale

Si elencano di seguito gli interventi PNRR candidati dalle società ed enti del Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) che impattano sul territorio Comunale, aggiornati alla data del 31/12/2023.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.**

M2C4I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

CUP I74E20001940008

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-22 Potenziamento e messa in sicurezza del sistema di adduzione dell'acquedotto di Livorno e Collesalveti, attualmente alimentato da un'unica condotta in fibrocemento lunga 45 Km, che presenta diverse criticità in parte sanate con l'attuale piano degli investimenti.

Collegamento Stagno-Cisternone, ampliamento serbatoio Banditella, ampliamento serbatoio Cisternone, collegamento Parco Levante-Banditella, potenziamento impianto Mortaiolo con addolcitore

Importo totale del finanziamento PNRR: € 16.192.321,08

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Livorno-Collesalveti

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lotto 1 - Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Mortaiolo per il miglioramento della qualità e quantità dell'acqua prodotta - affidato appalto integrato – in corso progettazione esecutiva – avvio lavori previsto a maggio 2024.

- Collegamento impianto Mortaiolo con serbatoio di Stagno: lavori avviati in data 08/01/2024

Lotto 2 - Nuova condotta adduttrice Parco Levante-serbatoio Banditella e collegamento viale Boccaccio-Aggiudicato - Emesso ordine-contratto per l'esecuzione dei lavori – avvio lavori previsto a luglio 2024

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Autorità Idrica Toscana A.I.T**

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

CUP H96D20000010007

Oggetto: progetto HUB Livorno fanghi-forsu-biometano-upgrading della stabilizzazione anaerobica

Importo totale del finanziamento PNRR: € 10.000.000,00

Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 30/05/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvato progetto di fattibilità tecnico economica

In corso la gara di appalto per l'affidamento di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture ed affiancamento e formazione post-intervento.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Casa Livorno e Provincia s.p.a. CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045530002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.219.294,16

Ubicazione intervento: Via Passaponti 23/29 – Livorno

Ultimazione prevista: 26/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045540002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.644.827,69

Ubicazione intervento: Via Amendola 43 - Livorno

Ultimazione prevista: 15/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045570002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.219.294,16

Ubicazione intervento: Via Passaponti 15/21- Livorno

Ultimazione prevista: 03/01/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045550002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.219.294,16

Ubicazione intervento: Via Passaponti 7/13 - Livorno

Ultimazione prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni**

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO. Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei Obiettivo 2: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private

CUP G44H22000050001

Oggetto: Intervento per l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nel Teatro C. Goldoni di Livorno

Importo totale del finanziamento PNRR: € 650.000,00

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Terminato il 1° lotto Relamping. In corso di assegnazione il 2° lotto Relamping. In corso di istruzione gara lavori meccanici. Lotto 3: Lavori agli impianti meccanici, comprensivi di smantellamenti ed impianti elettrici di servizio – lavori in corso

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Accademia Tecnologica Edilizia ITS ATE**

Potenziamento offerta servizi istruzione. Investimento 1.5: sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS). Potenziamento dei laboratori per ITS Academy- Decreto 10 maggio 2023 n.84

CUP J44D23001220006

Oggetto: Laboratorio per ITS ATE

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.730.589,66

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Dicembre 2023: acquisizione CIG e avvio delle procedure degli affidamenti dei lotti previsti dai CIG.

Completamento procedure: entro 29/04/2024

Chiusura progetto LED: entro dicembre 2025

b) Interventi PNRR con ricadute sul territorio provinciale e limitrofo

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **ASA SPA**

M2C4I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

CUP I24E20001140001

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-23: Sistema idrico Alta/Bassa Val di Cecina - Adduttrici, accumuli, risorse Val di Cecina (Lotti 1,2,3,4)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 854.009,51

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Cecina (LI)

Fine prevista: 30/06/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lotto 2: Serbatoio del Paratino e annessa centrale di sollevamento- Cecina (LI)- Aggiudicato – Avviati i lavori in data 09/10/2023.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **A.I.T.**

M2C4I4.4 Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione Intervento “a regia MiTE – DG USSRI”

CUP I66D02000020008

Oggetto: Revamping e Riuso Irriguo del Depuratore di Campo alla Croce di Venturina (LI)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 6.632.313,49

Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Venturina (LI)

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicato appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C92C21001860002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.245.024,46

Ubicazione intervento: Via Pertini 23/29 - Portoferraio (LI)

Ultimazione prevista: 09/05/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054490002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 535.801,25

Ubicazione intervento: Via C. Pisacane 66 - Piombino (LI)

Ultimazione prevista: 02/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054500002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 426.161,14

Ubicazione intervento: Località Padreterno 2-4 - Rio (LI)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032790002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.528.936,00

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032800002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.730.468,55

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati

Società del Gruppo Pubblico Comunale

Totale interventi PNRR complessivi: € 49.828.335,30

7. CONCLUSIONI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO (marzo 2024)

Per completezza di esposizione, ricordiamo che il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (decreto PNRR quater)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, ha previsto, tra le altre cose, il definanziamento di alcune opere, con il conseguente trasferimento su fondi nazionali.

Tali interventi riguardano le piccole e medie opere per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni e la rigenerazione urbana.

Si chiarisce inoltre che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (piccole e medie opere), per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, è in ogni caso richiesto l’utilizzo del sistema informativo ReGiS.
